DỰ THẢO · CHỜ MINH CHỨNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP ·

Enterprise CRM

TTCS_N1 · Kỳ thực tập 23/09–26/10/2026 · Báo cáo Sprint 1–4

THÀNH VIÊN

Triệu Quang Dũng – Leader / FE
BE: Lê Minh Danh · Đỗ Tuấn Dũng
Nguyễn Trần Việt Anh · Nguyễn Thùy Chang · Phạm Xuân Bình
FE: Hứa Huệ An · Hoàng Lan Anh
Châu Thùy Dung · Nguyễn Ngọc Anh

MENTOR HƯỚNG DẪN

Triệu Quang Dũng

ĐƠN VỊ

CodeGym

TRƯỜNG · NGÀNH

ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên · CNTT
Lớp CNTT K23G

NGÀY BÁO CÁO

21/10/2026

PHẦN A

Kết quả nhóm

Dự án · Quy trình · Minh chứng Jira & Git · Sản phẩm · Tỉ lệ đóng góp

Người trình bày dự kiến: Triệu Quang Dũng · Khoảng 10 phút

A · 01 — TỔNG QUAN

Tổng quan dự án

Bài toán / ý tưởng

Thông tin khách hàng rời rạc, dễ trùng; khó kiểm soát sở hữu và phản hồi lead đúng hạn.

Người dùng / người chơi

Sales, trưởng nhóm, giám đốc; Marketing, CSKH, kế toán và Admin.

Mục tiêu đầu kỳ

- S1: truy cập đúng quyền.
- S2: cấu hình thống nhất.
- S3: hồ sơ khách hàng 360.
- S4: lead có ưu tiên và người nhận.

Loại sản phẩm	Nền tảng	Thời gian	Thành viên
Web app — CRM	**Web responsive**	**4 sprint · 23/9–20/10**	**10 thành viên**

A · 02 — QUY TRÌNH

Quy trình & cách làm việc nhóm

SPRINT 1
23/09–29/09/2026
Tài khoản và phân quyền

SPRINT 2
30/09–06/10/2026
Danh mục và cấu hình

SPRINT 3
07/10–13/10/2026
Khách hàng 360

SPRINT 4
14/10–20/10/2026
Lead và phân bổ

Mô hình làm việc

- Sprint dài 1 tuần, bắt đầu 23/09.
- Daily / review / retro: cần lịch họp.
- Họp mentor: cần lịch cụ thể.

Công cụ

- Jira — backlog và công việc.
- GitHub — mã nguồn, PR, CI.
- Kênh trao đổi / thiết kế: cần xác nhận.

Quy tắc Git

- Nhánh main, develop và các nhánh tính năng đã có.
- Quy tắc review / commit thực tế: cần nhóm xác nhận.

A · 03 — MINH CHỨNG JIRA

Product Backlog của dự án



CẦN ẢNH PRODUCT BACKLOG

Chụp rõ epic, user story, trạng thái và ngày chụp

Tổng số issue	Đã Done
199	135

Còn tồn	Hoàn thành backlog
64	67,8%

Epic chính

- EP-01: Tài khoản / phân quyền
- EP-02: Danh mục / cấu hình
- EP-03/04: Khách hàng / Lead

Nguồn: export 18/10 · N1 / Board 3 (mở link)

A · 04 — MINH CHỨNG JIRA

Tiến độ theo sprint

CẦN ẢNH VELOCITY

Story point cam kết so với hoàn thành

CẦN ẢNH BURNDOWN

Sprint tiêu biểu + ngày chụp

Sprint	Mục tiêu sprint	SP cam kết	SP hoàn thành	Tỉ lệ
Sprint 1	Tài khoản / phân quyền	Chờ số liệu	Chờ số liệu	—
Sprint 2	Danh mục / cấu hình	Chờ số liệu	Chờ số liệu	—
Sprint 3	Khách hàng 360	Chờ số liệu	Chờ số liệu	—
Sprint 4	Lead / phân bổ	Chờ số liệu	Chờ số liệu	—
Tổng	Kế hoạch gốc: 172 SP	Chưa chốt	Chưa chốt	—

Nguồn: cần Jira Reports; không dùng SP kế hoạch thay SP cam kết

A · 05 — MINH CHỨNG GIT

Hoạt động phát triển trên Git (1/2)

Thành viên	Commit	PR merge	PR review	+/- dòng
Triệu Quang Dũng	—	—	—	—
Lê Minh Danh	—	—	—	—
Đỗ Tuấn Dũng	—	—	—	—
Nguyễn Trần Việt Anh	—	—	—	—
Nguyễn Thùy Chang	—	—	—	—
Tổng nhóm con	—	—	—	—

Cách lấy số liệu

git shortlog -sn --no-merges
git log --author="tên" --numstat

Hoặc GitHub / GitLab › Insights › Contributors

</>

CẦN ẢNH CONTRIBUTORS / COMMIT GRAPH

Đúng repository, nhánh và kỳ thống kê

Git: QuangDung1708/TTCS_N1 · đến 21/10 · chờ thống kê

A · 05 — MINH CHỨNG GIT


Hoạt động phát triển trên Git (2/2)

Thành viên	Commit	PR merge	PR review	+/- dòng
Phạm Xuân Bình	—	—	—	—
Hứa Huệ An	—	—	—	—
Hoàng Lan Anh	—	—	—	—
Châu Thùy Dung	—	—	—	—
Nguyễn Ngọc Anh	—	—	—	—
Tổng nhóm con	—	—	—	—

Cách lấy số liệu

git shortlog -sn --no-merges
git log --author="tên" --numstat

Hoặc GitHub / GitLab › Insights › Contributors



CẦN ẢNH CONTRIBUTORS / COMMIT GRAPH

Đúng repository, nhánh và kỳ thống kê

A · 06 — MINH CHỨNG GIT

Quy trình Git & Pull Request tiêu biểu

Mô hình nhánh

`feature/*` → `develop` → `main`

Merge vào develop qua PR; main chỉ nhận bản phát hành

Quy tắc nhóm áp dụng

- Mô hình mong muốn: feature → develop → main.
- Cần PR thật có góp ý và chỉnh sửa sau review.
- CI frontend đã ghi nhận Success.
- Chưa đủ bằng chứng mọi PR có ≥1 review.


CẦN ẢNH PR CÓ CODE REVIEW

Rõ người review, góp ý và commit sửa sau đó

Cần số PR, URL và số bình luận review thực tế

A · 07 — KẾT QUẢ SẢN PHẨM

Sản phẩm và kết quả hiện có

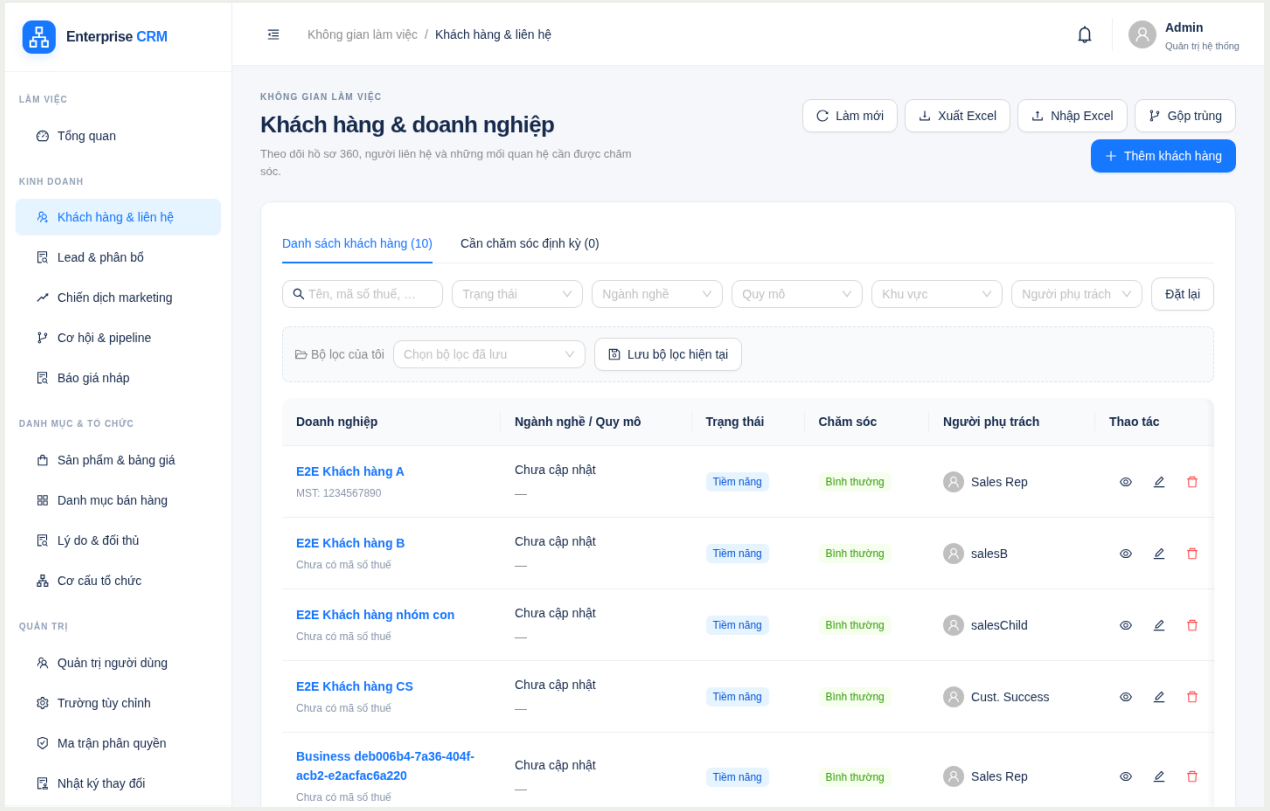

Chức năng trong phạm vi S1–4


- S1: tài khoản và phân quyền.
- S2: danh mục, cây tổ chức.
- S3: khách hàng / liên hệ / 360.
- S4: lead, điểm và phân bổ.

Truy cập sản phẩm

Mức độ: có bản chạy local và test.
Deploy: cần URL xác nhận.
Video demo 2–3 phút: cần link.
Ảnh: giao diện thật từ repository.

A · 08 — KỸ THUẬT

Kiến trúc & công nghệ

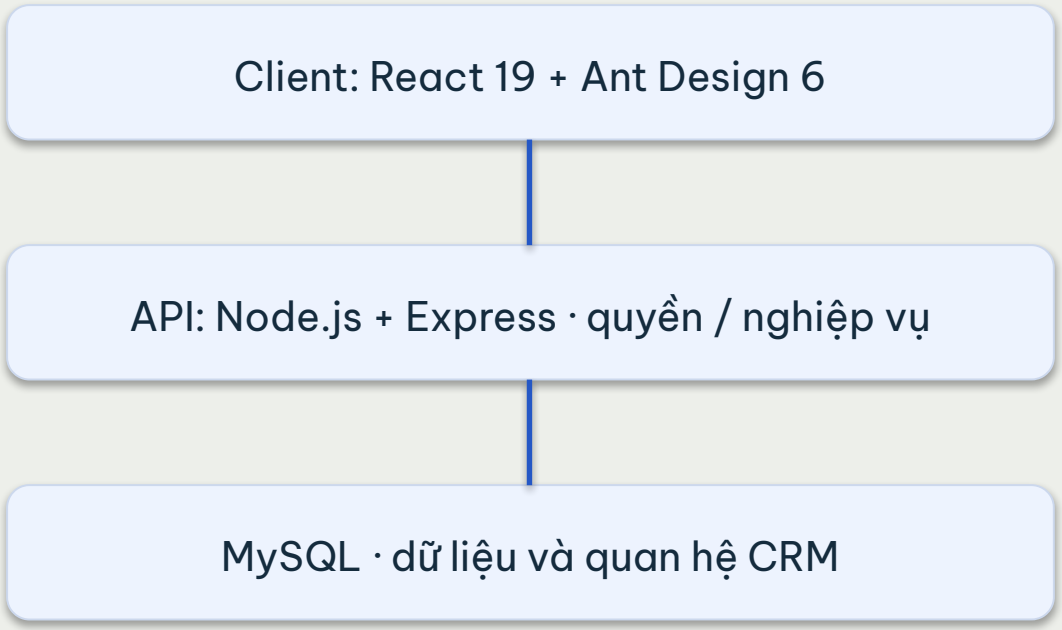

LẬP TRÌNH WEB

Frontend	**React 19 · Ant Design 6**
Backend	Node.js · Express
Database	MySQL; test cả MariaDB
Triển khai	Local đã chạy; deploy cần xác nhận

A · 09 — KẾT QUẢ SẢN PHẨM

Mục tiêu đầu kỳ ↔️ Kết quả thực tế

STT	Hạng mục	Mục tiêu đầu kỳ	Kết quả / Jira 18/10	Trạng thái	Minh chứng
1	Sprint 1	Truy cập đúng quyền	8/10 story Done; 2 IP	Một phần	Jira + test
2	Sprint 2	Cấu hình thống nhất	10/10 story Done*	Done trên Jira*	Jira + giao diện
3	Sprint 3	Khách hàng 360	3/9 Done; 6 IP	Một phần	Jira + ảnh 360
4	Sprint 4	Lead có người nhận	9 story To Do; có code/test	Chờ nghiệm thu	Jira + audit S4

Story Done: 21/38 = 55,3% (snapshot 18/10)

*S2-02 lệch nội dung giữa Jira và backlog.

A · 10 — KẾT QUẢ SẢN PHẨM

Chỉ số chất lượng & hiệu năng

Story point Done	Bug đã xử lý	Test case đạt	Người dùng / chơi thử
Chờ số SP	**Chờ thống kê**	**100%***	**Chờ thống kê**

Nhóm chỉ số	Web — đo gì	Nguồn đo	Kết quả đã ghi nhận
Chất lượng	Backend / trình duyệt	Log test / CI	121/121 backend; 50/50 browser
Hiệu năng	360 / phân bổ lead	Cần benchmark	Chưa kết luận 1,5s / 5 phút
Hoàn thiện	Deploy / người test	Cần link và danh sách	Có bản local; chưa đủ số liệu deploy

*Theo log từng bản đã kiểm thử; không phải lần chạy mới hôm nay.

A · 11 — ĐÓNG GÓP

Tỉ lệ đóng góp của thành viên (1/2)

Thành viên	SP (40%)	PR + review (30%)	Đánh giá chéo (20%)	Mentor (10%)	Tổng
Triệu Quang Dũng	—	—	—	—	—
Lê Minh Danh	—	—	—	—	—
Đỗ Tuấn Dũng	—	—	—	—	—
Nguyễn Trần Việt Anh	—	—	—	—	—
Nguyễn Thùy Chang	—	—	—	—	—

Tỉ lệ đóng góp cuối cùng

CHƯA TÍNH — cần đủ dữ liệu, đán

Công thức mẫu: 40% SP + 30% PR/review + 20% đánh giá chéo + 10% mentor.
Chưa có số liệu: không chia đều, không ước lượng. Tổng cuối cùng phải = 100%.

Nguồn: Jira · Git · phiếu đánh giá chéo · nhận xét mentor

A · 11 — ĐÓNG GÓP

Tỉ lệ đóng góp của thành viên (2/2)

Thành viên	SP (40%)	PR + review (30%)	Đánh giá chéo (20%)	Mentor (10%)	Tổng
Phạm Xuân Bình	—	—	—	—	—
Hứa Huệ An	—	—	—	—	—
Hoàng Lan Anh	—	—	—	—	—
Châu Thùy Dung	—	—	—	—	—
Nguyễn Ngọc Anh	—	—	—	—	—

Tỉ lệ đóng góp cuối cùng

CHƯA TÍNH — cần đủ dữ liệu, đán

Công thức mẫu: 40% SP + 30% PR/review + 20% đánh giá chéo + 10% mentor.
Chưa có số liệu: không chia đều, không ước lượng. Tổng cuối cùng phải = 100%.

Nguồn: Jira · Git · phiếu đánh giá chéo · nhận xét mentor

PHẦN B

Đóng góp cá nhân

Vai trò · Đóng góp tiêu biểu · Năng lực tăng lên

Dũng → Backend → Frontend · 3 slide/người · cần nhóm chốt thứ tự và thời lượng

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Triệu Quang Dũng · Leader / Frontend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- Tài khoản, phân quyền; tích hợp và kiểm thử.
- Issue Done tiêu biểu: N1-6, N1-5, N1-8.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-6, N1-5, N1-8, N1-47

Issue Done*
29

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · TRIỆU QUANG DŨNG

Đồng bộ luồng khôi phục mật khẩu và xử lý gửi mail

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
Tài khoản, phân quyền; tích hợp và kiểm thử.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-6, N1-5

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · TRIỆU QUANG DŨNG

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
React / UI / tích hợp	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Lê Minh Danh · Backend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- API khách hàng, phát hiện và gộp trùng.
- Issue Done tiêu biểu: N1-196, N1-197, N1-206.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-196, N1-197, N1-206, N1-207

Issue Done*
12

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · LÊ MINH DANH

Gộp khách hàng và bảo toàn dữ liệu liên quan

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
API khách hàng, phát hiện và gộp trùng.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-196, N1-197

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · LÊ MINH DANH

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
Node.js / API / dữ liệu	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Đỗ Tuấn Dũng · Backend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- API người liên hệ, chuyển công ty và lịch sử.
- Issue Done tiêu biểu: N1-199, N1-200.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-199, N1-200

Issue Done*	11
Story point	Chờ SP
Commit	Chờ Git
PR đã merge	Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm

Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · ĐỖ TUẤN DŨNG

Chuyển người liên hệ mà không mất lịch sử

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
API người liên hệ, chuyển công ty và lịch sử.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-199, N1-200

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · ĐỖ TUẤN DŨNG

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
Node.js / API / dữ liệu	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Nguyễn Trần Việt Anh · Backend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- API hồ sơ 360, truy vấn và công ty mẹ/con.
- Issue Done tiêu biểu: N1-203, N1-204, N1-209.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-203, N1-204, N1-209

Issue Done*
13

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH

Truy vấn tổng hợp hồ sơ khách hàng 360

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
API hồ sơ 360, truy vấn và công ty mẹ/con.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-203, N1-204

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
Node.js / API / dữ liệu	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thùy Chang · Backend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- Đọc Excel, kiểm tra dữ liệu và API bộ lọc.
- Issue Done tiêu biểu: N1-211, N1-214.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-211, N1-214

Issue Done*
10

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · NGUYỄN THÙY CHANG

Xem trước và kiểm tra dữ liệu nhập Excel

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
Đọc Excel, kiểm tra dữ liệu và API bộ lọc.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-211, N1-214

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · NGUYỄN THÙY CHANG

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
Node.js / API / dữ liệu	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Phạm Xuân Bình · Backend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- API chăm sóc định kỳ và đánh dấu liên hệ.
- Issue Done tiêu biểu: N1-219, N1-220.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-219, N1-220

Issue Done*
11

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · PHẠM XUÂN BÌNH

Danh sách khách hàng cần chăm sóc định kỳ

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
API chăm sóc định kỳ và đánh dấu liên hệ.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-219, N1-220

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · PHẠM XUÂN BÌNH

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
Node.js / API / dữ liệu	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Hứa Huệ An · Frontend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- Giao diện khách hàng và so sánh/gộp trùng.
- Issue Done tiêu biểu: N1-198, N1-208.
- Chưa Done trong export: N1-230.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-198, N1-208, N1-230

Issue Done*
11

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · HỨA HUỆ AN

Giao diện so sánh và gộp khách hàng

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
Giao diện khách hàng và so sánh/gộp trùng.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-198, N1-208

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · HỨA HUỆ AN

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
React / UI / tích hợp	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Hoàng Lan Anh · Frontend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- Giao diện liên hệ, chuyển công ty và chăm sóc.
- Issue Done tiêu biểu: N1-201, N1-202, N1-221.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-201, N1-202, N1-221

Issue Done*
12

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · HOÀNG LAN ANH

Giao diện chuyển liên hệ có lịch sử

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
Giao diện liên hệ, chuyển công ty và chăm sóc.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-201, N1-202

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · HOÀNG LAN ANH

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
React / UI / tích hợp	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Châu Thùy Dung · Frontend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- Giao diện hồ sơ 360; báo cáo nhập Excel được giao.
- Issue Done tiêu biểu: N1-205.
- Chưa Done trong export: N1-224.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-205, N1-224

Issue Done*
10

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · CHÂU THÙY DUNG

Giao diện khách hàng 360 và dữ liệu liên quan

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
Giao diện hồ sơ 360; báo cáo nhập Excel được giao.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-205

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · CHÂU THÙY DUNG

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
React / UI / tích hợp	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

B · 01 — VAI TRÒ & PHẠM VI PHỤ TRÁCH

Nguyễn Ngọc Anh · Frontend

Phạm vi được giao theo Jira · cần xác nhận

- Kiểm tra dòng Excel và giao diện bộ lọc.
- Issue Done tiêu biểu: N1-212, N1-215.
- Chưa Done trong export: N1-229.
- Cần người phụ trách xác nhận phần trực tiếp làm / hỗ trợ.

Ticket: N1-212, N1-215, N1-229

Issue Done*
10

Story point
Chờ SP

Commit
Chờ Git

PR đã merge
Chờ PR

Tỉ lệ đóng góp trong nhóm
Chờ xác nhận

*Non-Epic theo assignee trong export 18/10; không phải % đóng góp.

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · NGUYỄN NGỌC ANH

Hiển thị lỗi từng dòng khi nhập Excel

Vấn đề

Cần cá nhân mô tả hiện trạng và số đo trước khi sửa.

Chờ ảnh/log trước với kịch bản cụ thể.

Giải pháp

Dự thảo theo phạm vi Jira:
Kiểm tra dòng Excel và giao diện bộ lọc.

Cần mô tả phần trực tiếp làm và PR tương ứng.

Kết quả đo được

Chưa đủ số đo trước–sau để kết luận mức cải thiện.

Không tự đặt % cải thiện hoặc tốc độ.

CẦN ẢNH / SỐ ĐO TRƯỚC

CẦN ẢNH / SỐ ĐO SAU

Cần PR thật · Ticket tham chiếu: N1-212, N1-215

B · 03 — NĂNG LỰC TĂNG LÊN · NGUYỄN NGỌC ANH

Năng lực trước và sau kỳ thực tập

Năng lực	Trước (1–5)	Sau (1–5)	Minh chứng
React / UI / tích hợp	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Xác thực / nghiệp vụ / kiểm thử	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Git và Jira	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Giao tiếp và làm việc nhóm	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế
Tài liệu / demo / bàn giao	Tự đánh giá	Tự đánh giá	Cần ticket / PR / ví dụ thực tế

Nhận xét từ mentor / code review

Cần nhận xét thật, người nhận xét và ngày.

Tiếp tục cải thiện

Cần cá nhân nêu 1–2 điểm muốn phát triển.

PHẦN C

Tổng kết

Giá trị đạt được · Bài học · Hướng phát triển · Demo

Người trình bày dự kiến: Triệu Quang Dũng · Khoảng 7 phút

C · 01 — GIÁ TRỊ

Giá trị đạt được

Cho sản phẩm / doanh nghiệp

- Luồng tài khoản, khách hàng và lead có bản chạy/test.
- Cấu hình và dữ liệu được chuẩn hóa.
- Có tài liệu API và hướng dẫn kiểm thử.

Cho nhóm

- Có backlog, phân công và repository chung.
- Nhận diện lỗi tích hợp, CI và mail.
- Cần nhóm xác nhận bài học quy trình.

Cho cá nhân

- Có sản phẩm và ticket để trình bày.
- Có cơ sở đối chiếu năng lực.
- Chờ tự đánh giá và phản hồi mentor.

Giá trị chính: dữ liệu khách hàng tập trung, đúng quyền và lead có người chịu trách nhiệm.

C · 02 — BÀI HỌC

Bài học & điểm cần cải thiện

Kỹ thuật

BÀI HỌC

- Ẩn menu chưa đủ: API phải kiểm tra quyền.
- Import cần kiểm tra lại lúc xác nhận.

NẾU LÀM LẠI, NHÓM SẼ

- Chốt AC và dữ liệu test sớm; kiểm tra lỗi âm tính và thao tác đồng thời.

Làm việc nhóm

BÀI HỌC

- Code chạy được không đồng nghĩa Jira đã Done.
- Nhánh độc lập khác nhánh feature từ develop.

NẾU LÀM LẠI, NHÓM SẼ

- Đồng bộ trạng thái, PR review và minh chứng ngay trong sprint.

Khó khăn lớn nhất & cách xử lý

CI frontend lỗi đường dẫn / giới hạn login → sửa test harness, cô lập dữ liệu test → ghi nhận 50/50 case pass.

C · 03 — HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng phát triển tiếp theo

Roadmap sản phẩm

NGẮN HẠN Chốt AC, sửa gợi ý lead sau gộp, bổ sung minh chứng.

1–3 THÁNG Đo hiệu năng 360/phân bổ; triển khai môi trường demo ổn định.

DÀI HẠN Hoàn thiện luồng cơ hội, báo giá, hợp đồng và báo cáo theo backlog.

Định hướng nghề nghiệp

- Cần mỗi thành viên cung cấp:
- • Vị trí nghề nghiệp mong muốn.
- • Kế hoạch phát triển 6–12 tháng.
- • Kỹ năng và mốc học tập cụ thể.
- Không tự gán định hướng theo vai trò hiện tại.

PHẦN C · KẾT THÚC

Demo trực tiếp & Hỏi đáp

Cảm ơn mentor Triệu Quang Dũng, CodeGym và hội đồng đã lắng nghe.

SẢN PHẨM

Cần URL deploy / video demo

MÃ NGUỒN

github.com/QuangDung1708/TTCS_N1

JIRA

N1 / Board 3 — Backlog
